



**PUSAT KONSTRUKSI
BADAN LOGISTIK PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI**

**LAPORAN PROGRESS
PERKEMBANGAN PEKERJAAN
SBSN 2026
TAHUN ANGGARAN 2026**

Posisi 07 September 2026



PUSKON BALOGHAN KEMHAN



LAPJUSIK DAN DOKUMENTASI
PEMBANGUNAN MESS DAN FASILITAS PENUNJANG PUSREHAB KEMHAN
PERIODE: 31 Agustus 2026 S/D 7 September 2026

SASARAN :

- I. Persiapan
- II. Site Development
- III. Pembangunan Mess
- IV. Bangunan Penunjang
- V. Bangunan Power House
- VI. Bangunan Rumah Pompa
- VII. Pekerjaan SARPRAS
- VIII. Pembangunan Landscape
- IX. Pekerjaan ALSATRI
- X. Pekerjaan TPS

XI. Penyambungan Listrik PLN

REKAPITULASI LAPJUSIK

NILAI PAGU	MULAI	SELESAI	HARI TERPAKAI	JUSIK		
				REN	REAL	DEV
Rp. 279.277.178.000,00	10 / 04 / 2026	05 /12/2026	150	85,9696 %	85,1102 %	- 0,8594 %





LAPJUSIK DAN DOKUMENTASI PEKERJAAN KONSTRUKSI MESS DAN FASILITAS PENUNJANG PUSREHAB KEMHAN

III. A. PEKERJAAN ARSITEKTUR GEDUNG MESS & PARKIR (12,1680 %), DAN PEKERJAAN MEP (12,0597%)



Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Lobby Lift Lantai LG Sisi Barat



Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Lobby Lift Lantai LG sisi Timur



Pekerjaan Perapihan area Entrancee MCU



Kondisi area Ruang Control Panel Lantai LG





LAPJUSIK DAN DOKUMENTASI PEKERJAAN KONSTRUKSI MESS DAN FASILITAS PENUNJANG PUSREHAB KEMHAN



Pekerjaan Perapihan Lobby Lift Lantai 1 Parkir Sisi Barat



Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Lobby Lift Lantai 1 Parkir sisi Timur



Pekerjaan Perapihan Lobby Lift Lantai 1B Sisi Barat



Pemasangan Plester Dinding Lobby Lift Lantai 1B Sisi Timur





LAPJUSIK DAN DOKUMENTASI PEKERJAAN KONSTRUKSI MESS DAN FASILITAS PENUNJANG PUSREHAB KEMHAN



Area Parkir Yang Sudah Di Gunakan Pihak RSPPN Soedirman Lantai 1C



Kondisi Area Parkir lantai 1C



Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Lobby Lift Lantai 2 Sisi Timur



Pekerjaan Perapihan Lobby Lift Lantai 2 Parkir sisi Barat





LAPJUSIK DAN DOKUMENTASI PEKERJAAN KONSTRUKSI MESS DAN FASILITAS PENUNJANG PUSREHAB KEMHAN



Kondisi Area Parkir Lantai 2A



Kondisi Area Parkir Lantai 2A



Pekerjaan Perapihan Lobby Lift Lantai 2B sisi Barat



Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Lobby Lift Lantai 2B Parkir Sisi Timur





LAPJUSIK DAN DOKUMENTASI PEKERJAAN KONSTRUKSI MESS DAN FASILITAS PENUNJANG PUSREHAB KEMHAN



Kondisi Area Parkir Lantai 2C



Kondisi Area Parkir Lantai 2C



**Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding area Lobby Lift Lantai 3 Parkir
Sisi Barat**



**Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding area Lobby Lift Lantai 3 Parkir
Sisi Timur**





LAPJUSIK DAN DOKUMENTASI PEKERJAAN KONSTRUKSI MESS DAN FASILITAS PENUNJANG PUSREHAB KEMHAN



Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Lobby Lift Lantai 4 Stemcell



Pekerjaan Plester Aci Dinding Lantai 4 Stemcell



Pekerjaan Meja dan Kitchen Set Lantai 5 Mess



Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Lobby Lift Lantai 5 Mess



LAPJUSIK DAN DOKUMENTASI PEKERJAAN KONSTRUKSI MESS DAN FASILITAS PENUNJANG PUSREHAB KEMHAN



Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Lobby Lift Lantai 6 Mess sisi Timur



Pekerjaan Instalasi ME Lantai 6 Mess



Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Lobby Lift Lantai 7 Mess



Pekerjaan Pemasangan Hebel Dinding Balkon Lantai 7 Mess





LAPJUSIK DAN DOKUMENTASI PEKERJAAN KONSTRUKSI MESS DAN FASILITAS PENUNJANG PUSREHAB KEMHAN



Pekerjaan Pemasangan Plafond Lambersering dan Keramik Lantai 8



Pekerjaan Panggung Lantai 8



Pekerjaan Pemasangan Penangkal Petir



Fabrikasi Tiang Penangkal Petir



LAPJUSIK DAN DOKUMENTASI PEKERJAAN KONSTRUKSI MESS DAN FASILITAS PENUNJANG PUSREHAB KEMHAN



Penempatan Outdoor AC sisi Barat



Pekerjaan Instalasi Outdoor AC



Pemasangan Pelapis Kulit Luar Sisi Barat Gedung Mess Parkir



Pemasangan Pelapis Kulit Luar Sisi Timur Gedung Mess Parkir





LAPIJUSIK DAN DOKUMENTASI PEKERJAAN KONSTRUKSI MESS DAN FASILITAS PENUNJANG PUSREHAB KEMHAN



Kondisi Aktual Gd Mess Parkir dan Ruang Serbaguna Purehab Kemhan



Kondisi Aktual Gd Mess Parkir dan Ruang Serbaguna Purehab Kemhan



Kondisi Aktual Gd Mess Parkir dan Ruang Serbaguna Purehab Kemhan



Kondisi Aktual Gd Mess Parkir dan Ruang Serbaguna Purehab Kemhan



LAPJUSIK DAN DOKUMENTASI
PEKERJAAN KONSTRUKSI MESS DAN FASILITAS PENUNJANG PUSREHAB KEMHAN

IV. B. PEKERJAAN ARSITEKTUR BANGUNAN PENUNJANG (5,9124%), DAN PEKERJAAN MEP (4,6031%)




Pekerjaan Pasang Profil GRC Area Facade Lantai 1 Rumah Duka



Pekerjaan Meja Kitchen Lantai 1 Rumah Duka



Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Lift Penumpang Lantai 1 Rumah Duka

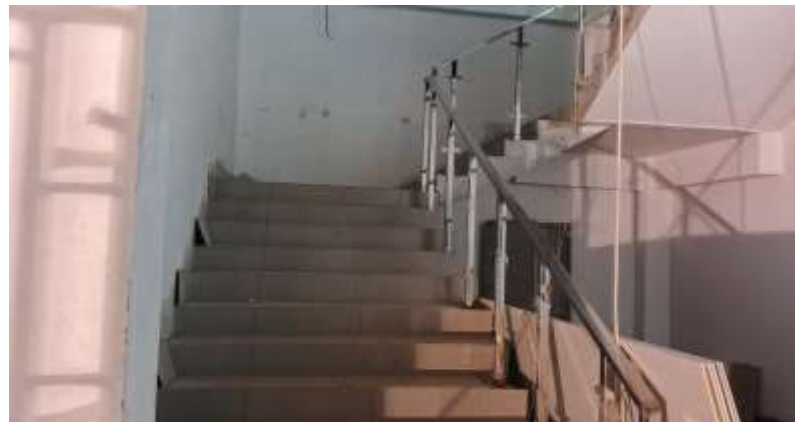

Pekerjaan Pemasangan Railing Tangga Lantai 1 Rumah Duka



LAPJUSIK DAN DOKUMENTASI PEKERJAAN KONSTRUKSI MESS DAN FASILITAS PENUNJANG PUSREHAB KEMHAN



Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Lift Lantai 2 Rumah Duka



Pekerjaan Pemasangan Plafond Lantai 2 Rumah Duka



Pekerjaan Pemasangan Angkur Railing Selasar Lantai 2 Rumah Duka



Pekerjaan Pemasangan Instalasi ME Lantai 2 Rumah Duka



LAPJUSIK DAN DOKUMENTASI PEKERJAAN KONSTRUKSI MESS DAN FASILITAS PENUNJANG PUSREHAB KEMHAN



Pekerjaan Pemasangan Rangka Plafond Lantai 3 Rumah Duka



Pekerjaan Pemasangan Dinding Lift Lantai 3 Rumah Duka



Pekerjaan Pemasangan Kaca Jendela Lantai 3 Rumah Duka



Pekerjaan Pemasangan Instalasi ME Lantai 3 Rumah Duka



LAPJUSIK DAN DOKUMENTASI PEKERJAAN KONSTRUKSI MESS DAN FASILITAS PENUNJANG PUSREHAB KEMHAN



Kondisi Aktual Bangunan Penunjang / Rumah Duka Purehab Kemhan



Kondisi Aktual Bangunan Penunjang / Rumah Duka Purehab Kemhan



Kondisi Aktual Bangunan Penunjang / Rumah Duka Purehab Kemhan



Kondisi Aktual Bangunan Penunjang / Rumah Duka Purehab Kemhan





**LAPJUSIK DAN DOKUMENTASI
PEKERJAAN KONSTRUKSI MESS DAN FASILITAS PENUNJANG PUSREHAB KEMHAN**

V. C. PEKERJAAN ARSITEKTUR POWER HOUSE (0,1175 %), DAN PEKERJAAN MEP (3,3616 %)



Kondisi dalam area Power House



Pekerjaan Pemasangan Kusen Pintu Besi Power House

VI. C. PEKERJAAN ARSITEKTUR RUMAH POMPA (0,0510 %), DAN PEKERJAAN MEP (1,9636 %)



Kondisi dalam area Ruang Pompa



Tampak Ruang Pompa dan Water Tank



**LAPIJUSIK DAN DOKUMENTASI
PEKERJAAN KONSTRUKSI MESS DAN FASILITAS PENUNJANG PUSREHAB KEMHAN**

VII. PEKERJAAN SARANA PRASARANA / SARPRAS (0,9771 %)



Pekerjaan Pembesian area Hardstanding sisi Timur



Pengecoran Hardstanding Damkar Sisi Timur



Pekerjaan Galian Box Culvert



Pekerjaan Galian Saluran Belakang Rumah Duka





LAPJUSIK DAN DOKUMENTASI
PEKERJAAN KONSTRUKSI MESS DAN FASILITAS PENUNJANG PUSREHAB KEMHAN

VIII. PEKERJAAN ALSATRI MESS DAN PARKIR DAN RUMAH DUKA (0,7824 %)



Backdrop Meja Nurseststion MCU sudah terpasang



Permukaan Backdrop Meja Nurseststion MCU



Pekerjaan Backdrop Meja Resepsionis Rumah Duka



Pekerjaan Meja Resepsionis Rumah Duka

